VIALIDAD Y ALUMBRADO | MGP

Informe anual de alumbrado 2013

Ente de Vialidad y Alumbrado
Municipalidad de General Pueyrredon
Mar del Plata | Batán

- Alumbrado Público Semi Especial
- Guardia alumbrado
- Obras alumbrado
- 147

Alumbrado Público Semi Especial – Brazos (APSE)

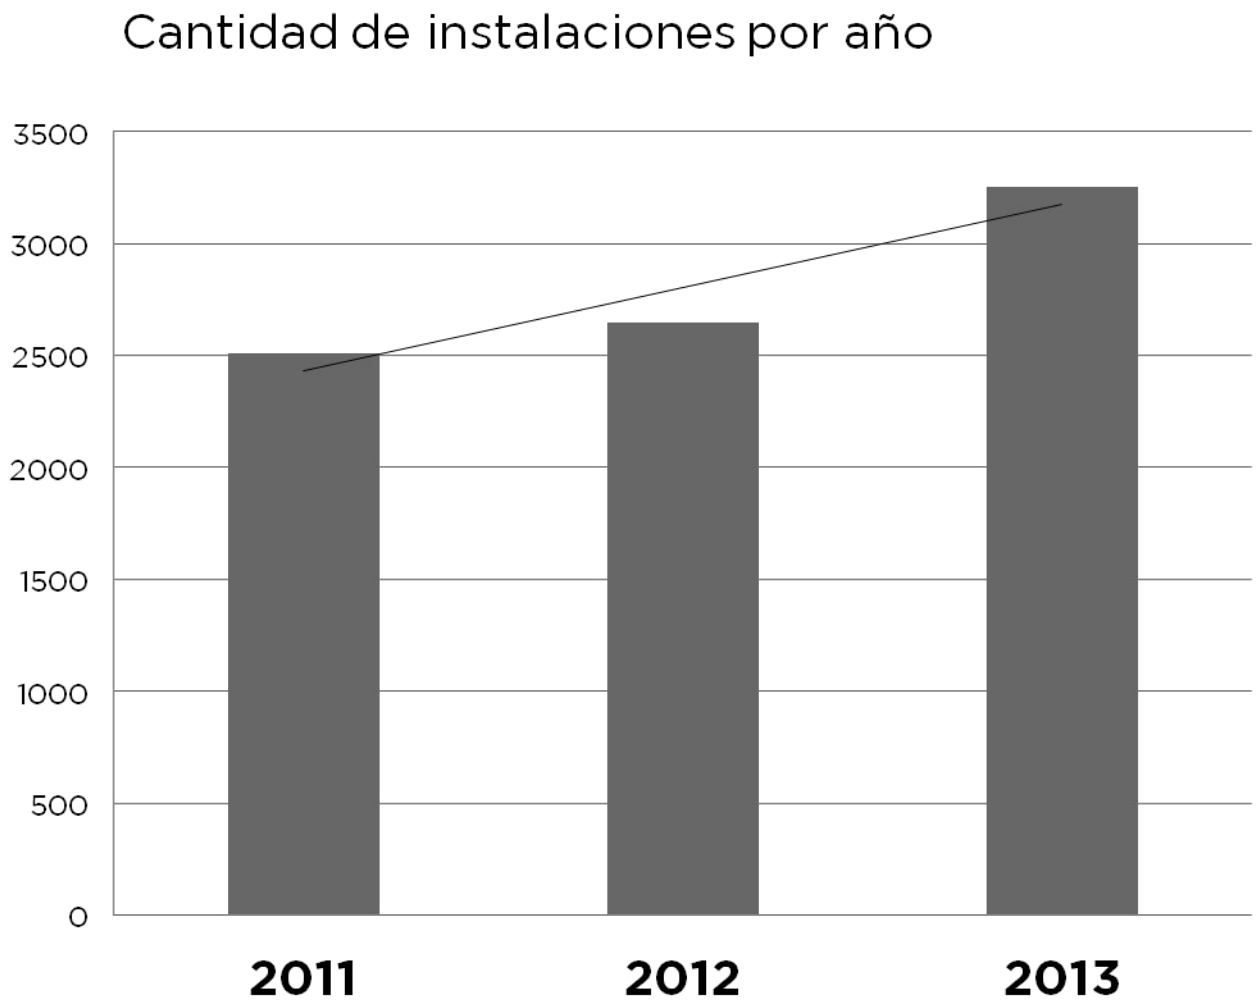
Cantidad de instalaciones por año
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2011
2012
2013

APSE | CANTIDAD DE INSTALACIONES POR MES

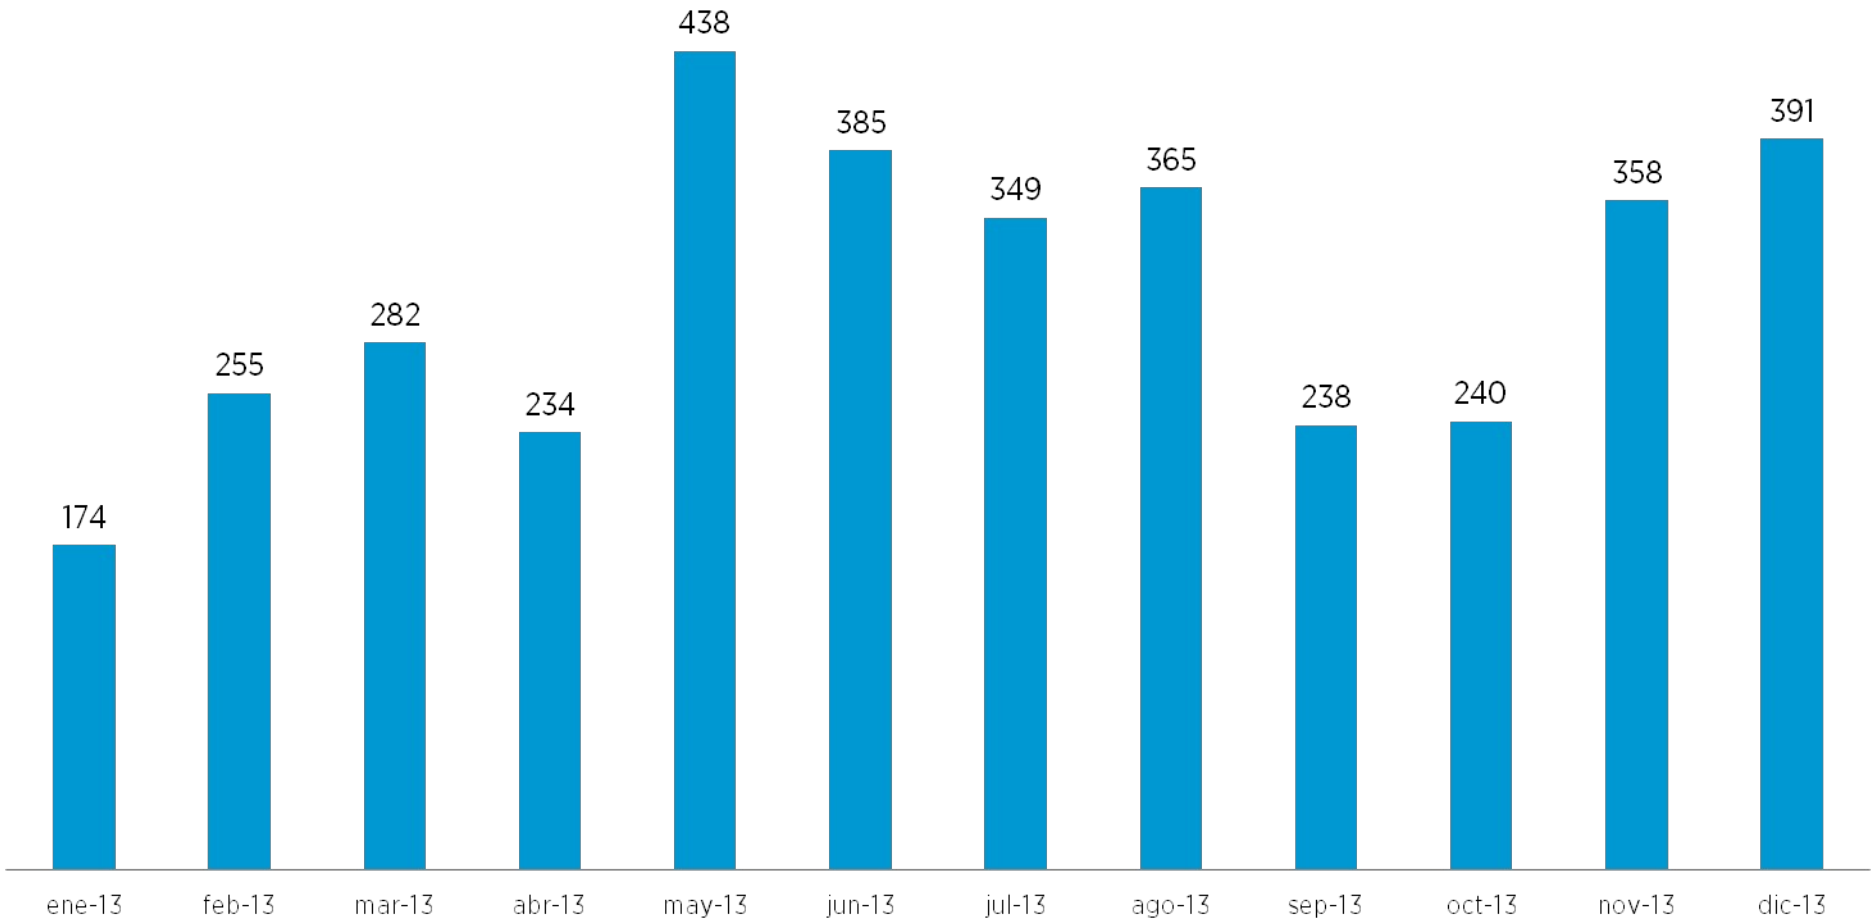

Acumulado 2013: 3709

APSE | CANTIDAD DE INSTALACIONES POR BARRIO

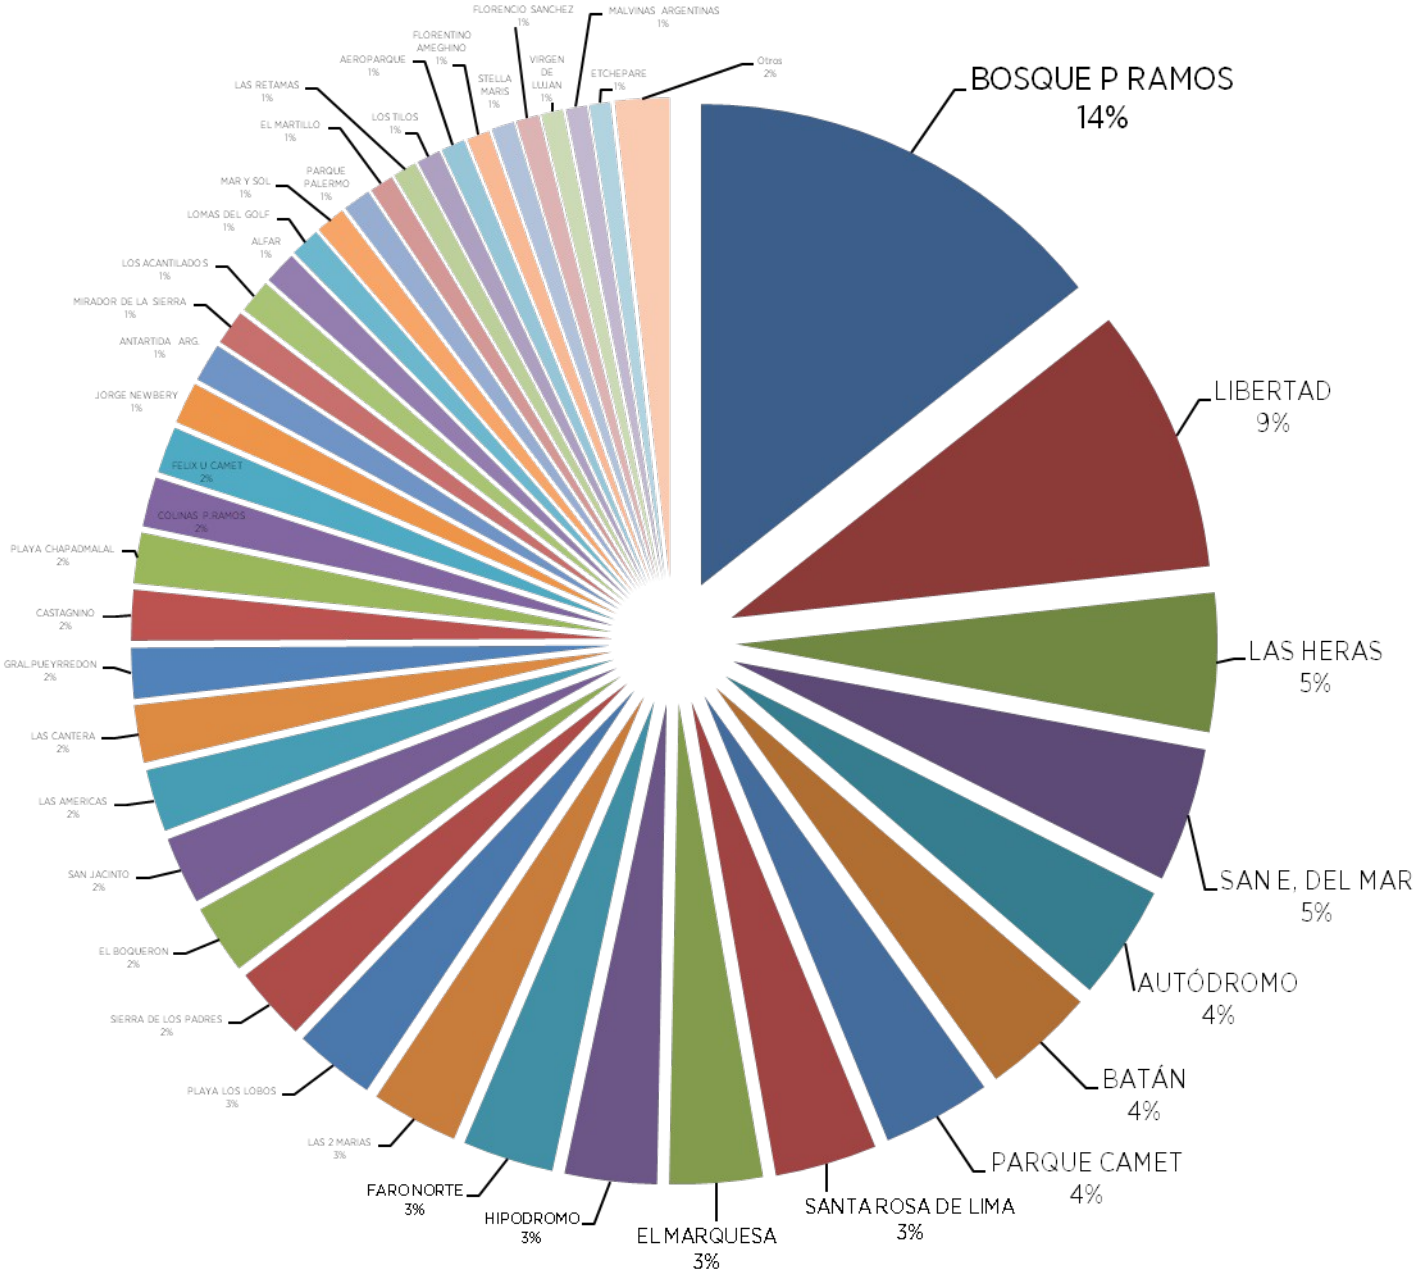

APSE | CANTIDAD DE INSTALACIONES POR BARRIO

BARRIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	Total
BOSQUE P RAMOS	58	97	1	10	115	1		109	30	421
LIBERTAD			114	4	57	28	10	12	10	235
LAS HERAS		3	1		13	69	50		3	139
AUTODROMO		52					64			116
SANTA ROSA DE LIMA				62		41				103
SAN EDUARDO DEL MAR					27	56	17			100
LAS 2 MARIAS				49	39					88
PARQUE CAMET	1	52	1	1		7	17		1	80
BATAN	39	1	11	1		1	1	9	11	74
SAN JACINTO					59	4		5		68
SIERRA DE LOS PADRES	6	2		3	1	20	10	10	16	68
LAS AMERICAS	29							30	1	60
EL BOQUERON		9				20			29	58
LAS CANTERA			34	10	10	4				58
PLAYA LOS LOBOS		1				6		45		52
CASTAGNINO				20	10			19	1	50
COLINAS P.RAMOS			50							50
EL SOSIEGO				39		10				49
FELIX U CAMET						1	46			47
GRAL.PUEYRREDON	22				11	3				36
JORGE NEWBERY		2		1	4			28		35
MIRADOR DE LA SIERRA			5	1	27		1		1	35
EL MARQUESA							34			34
LOS ACANTILADOS			1	11		10		1	10	33
PLAYA CHAPADMALAL			32							32
FARO NORTE		1			1				29	31
MAR Y SOL						27	3			30
LOMAS DEL GOLF	10					4	15			29
PARQUE PALERMO						28				28
LOS TILOS		24								24
STELLA MARIS							23			23
ETCHEPARE								21		21
LAS RETAMAS								10	11	21
ANTARTIDA ARG.									20	20

APSE | CANTIDAD DE INSTALACIONES POR BARRIO

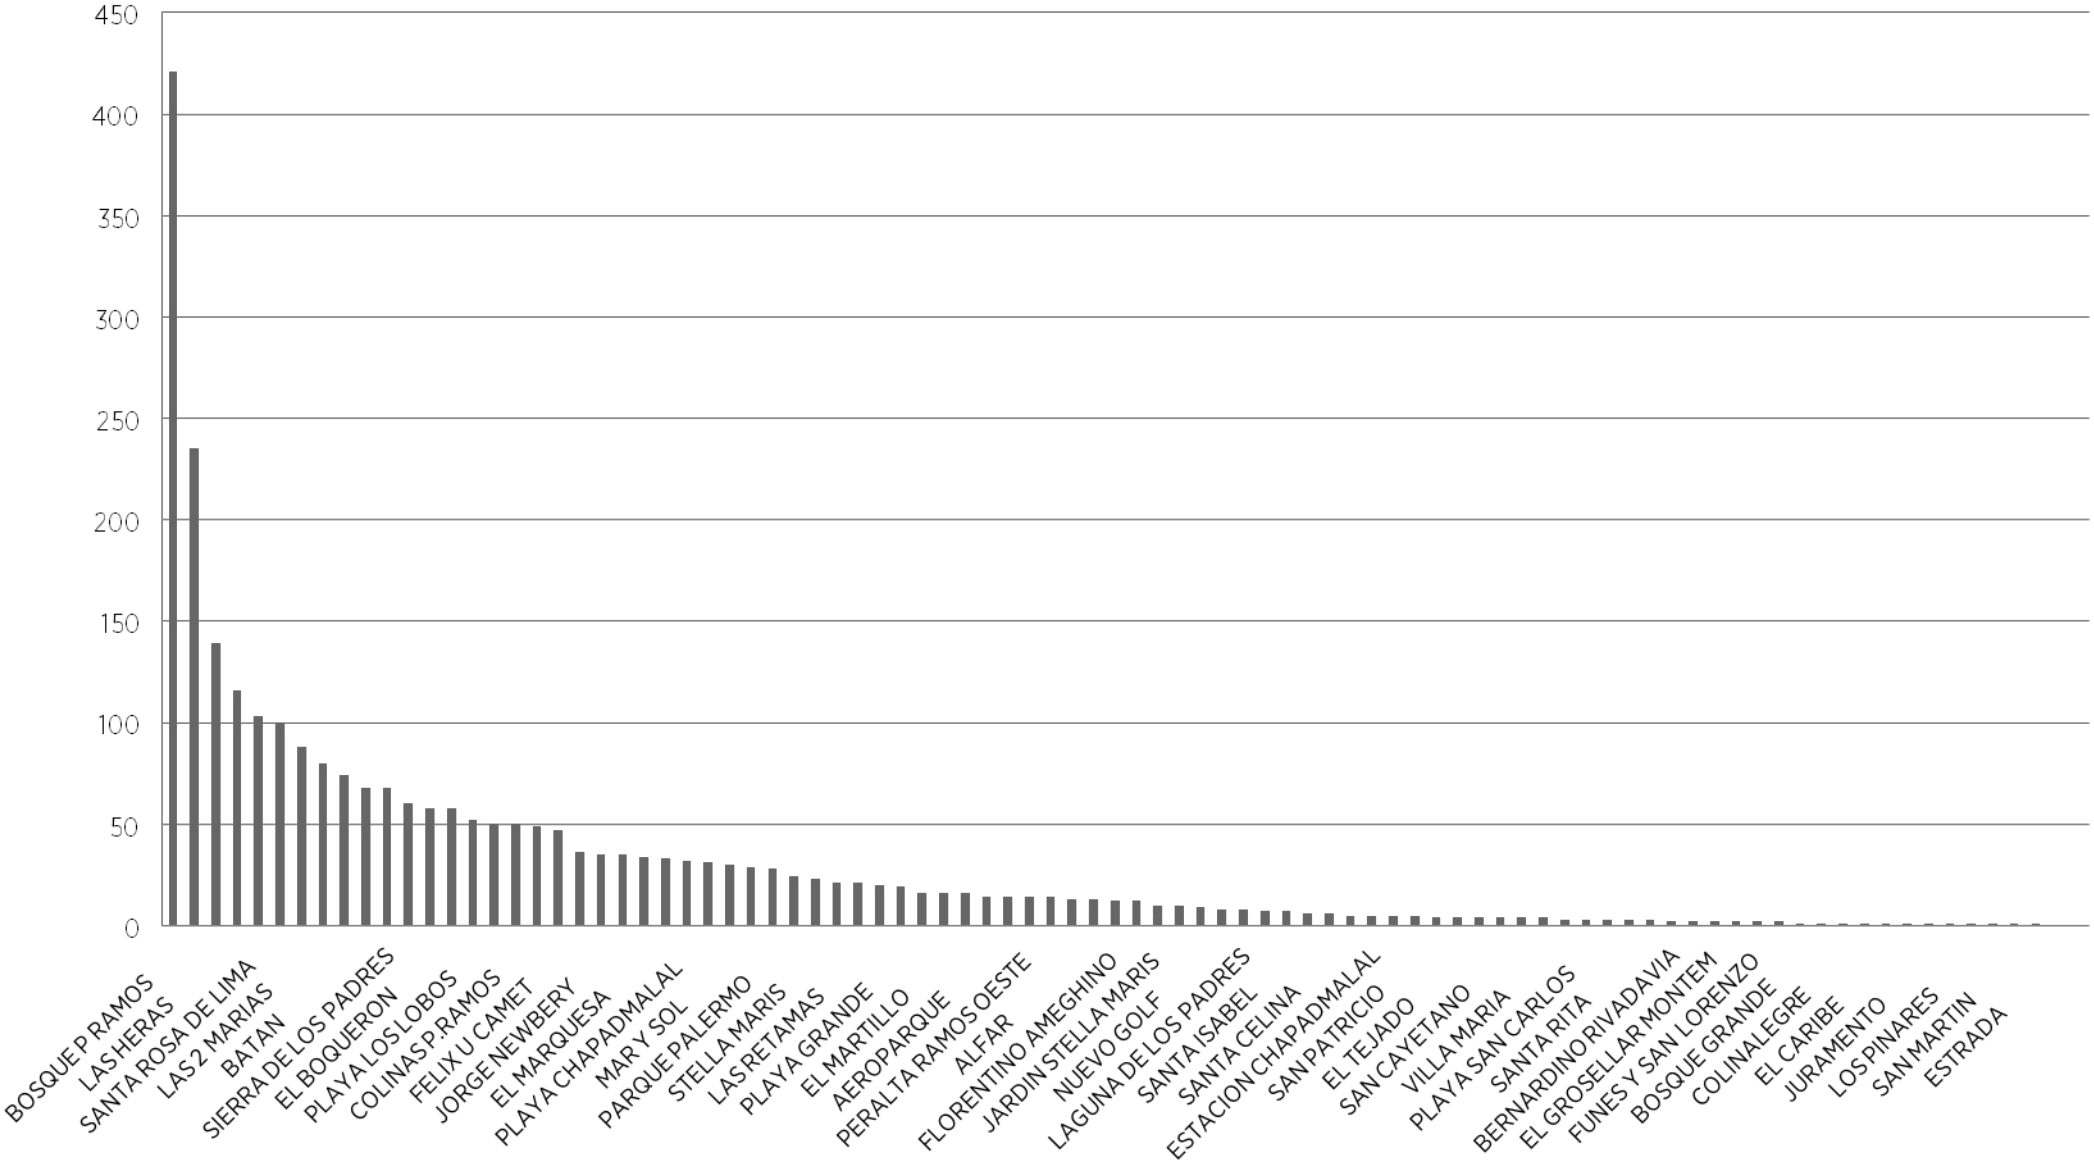

GUARDIA

Atención de Reclamos
y Mantenimiento Preventivo

GUARDIA | INTERVENCIONES EN LUMINARIAS POR MES

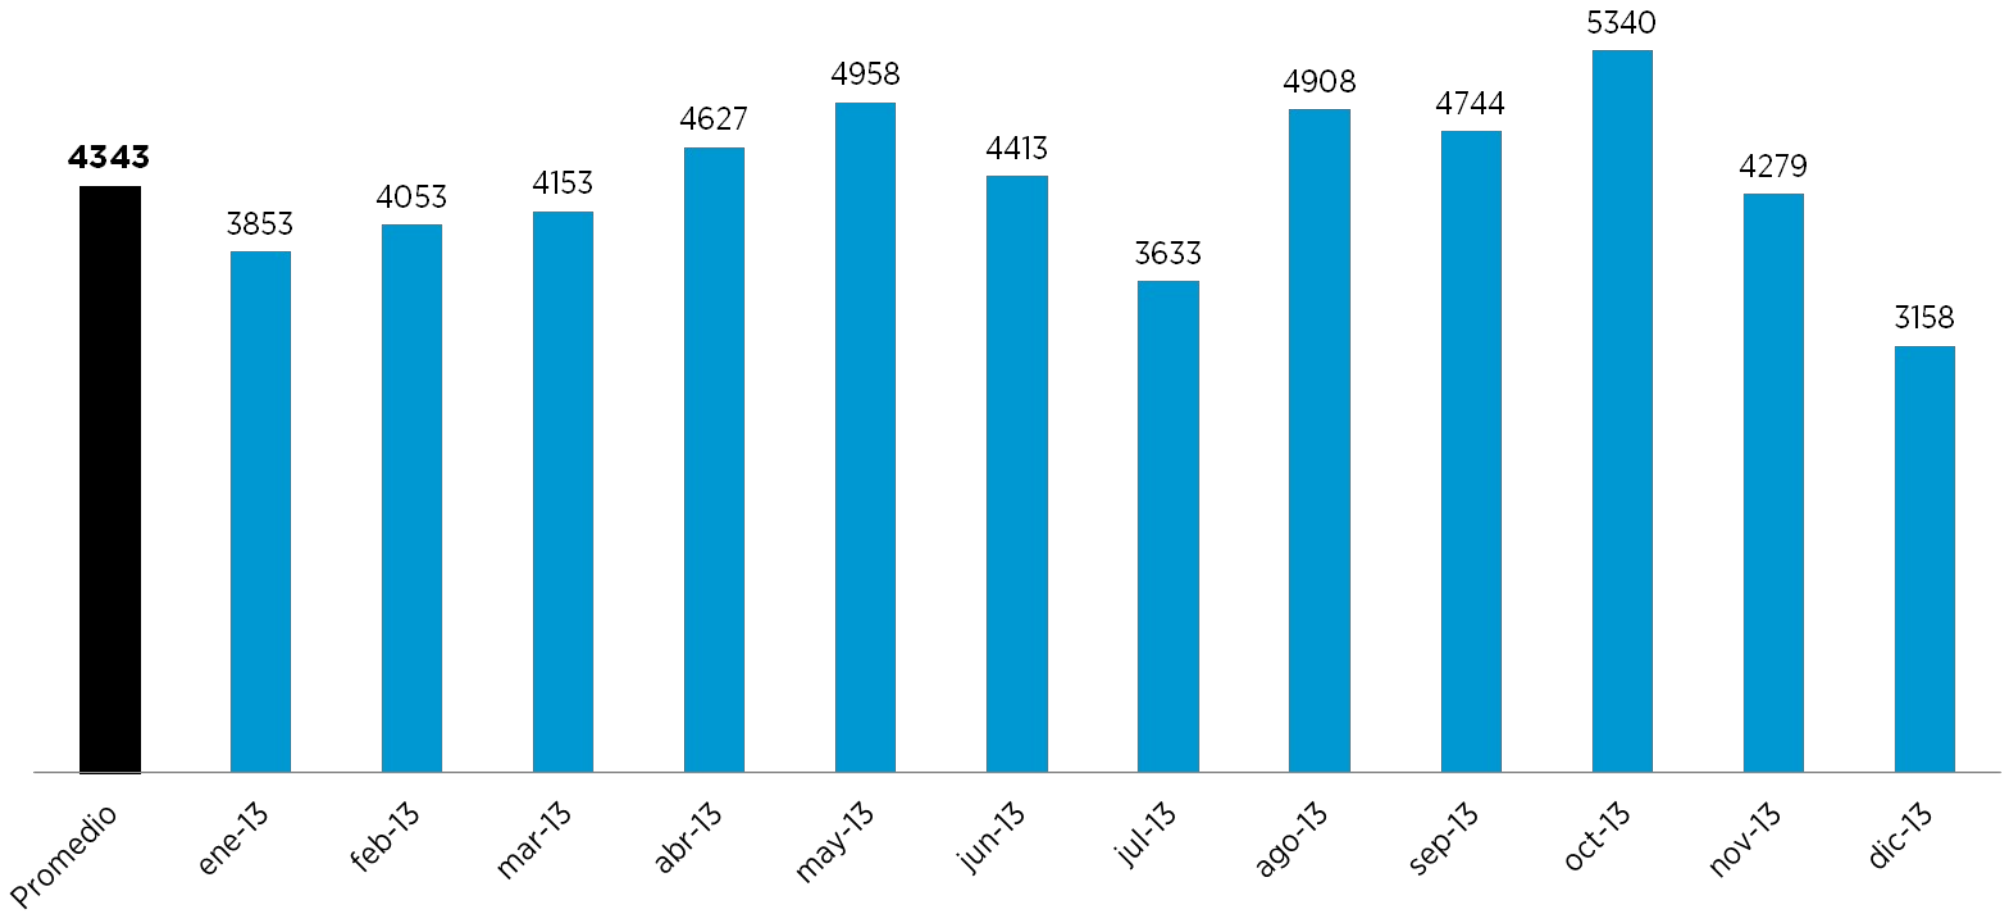

GUARDIA | INTERVENCIONES POR BARRIO

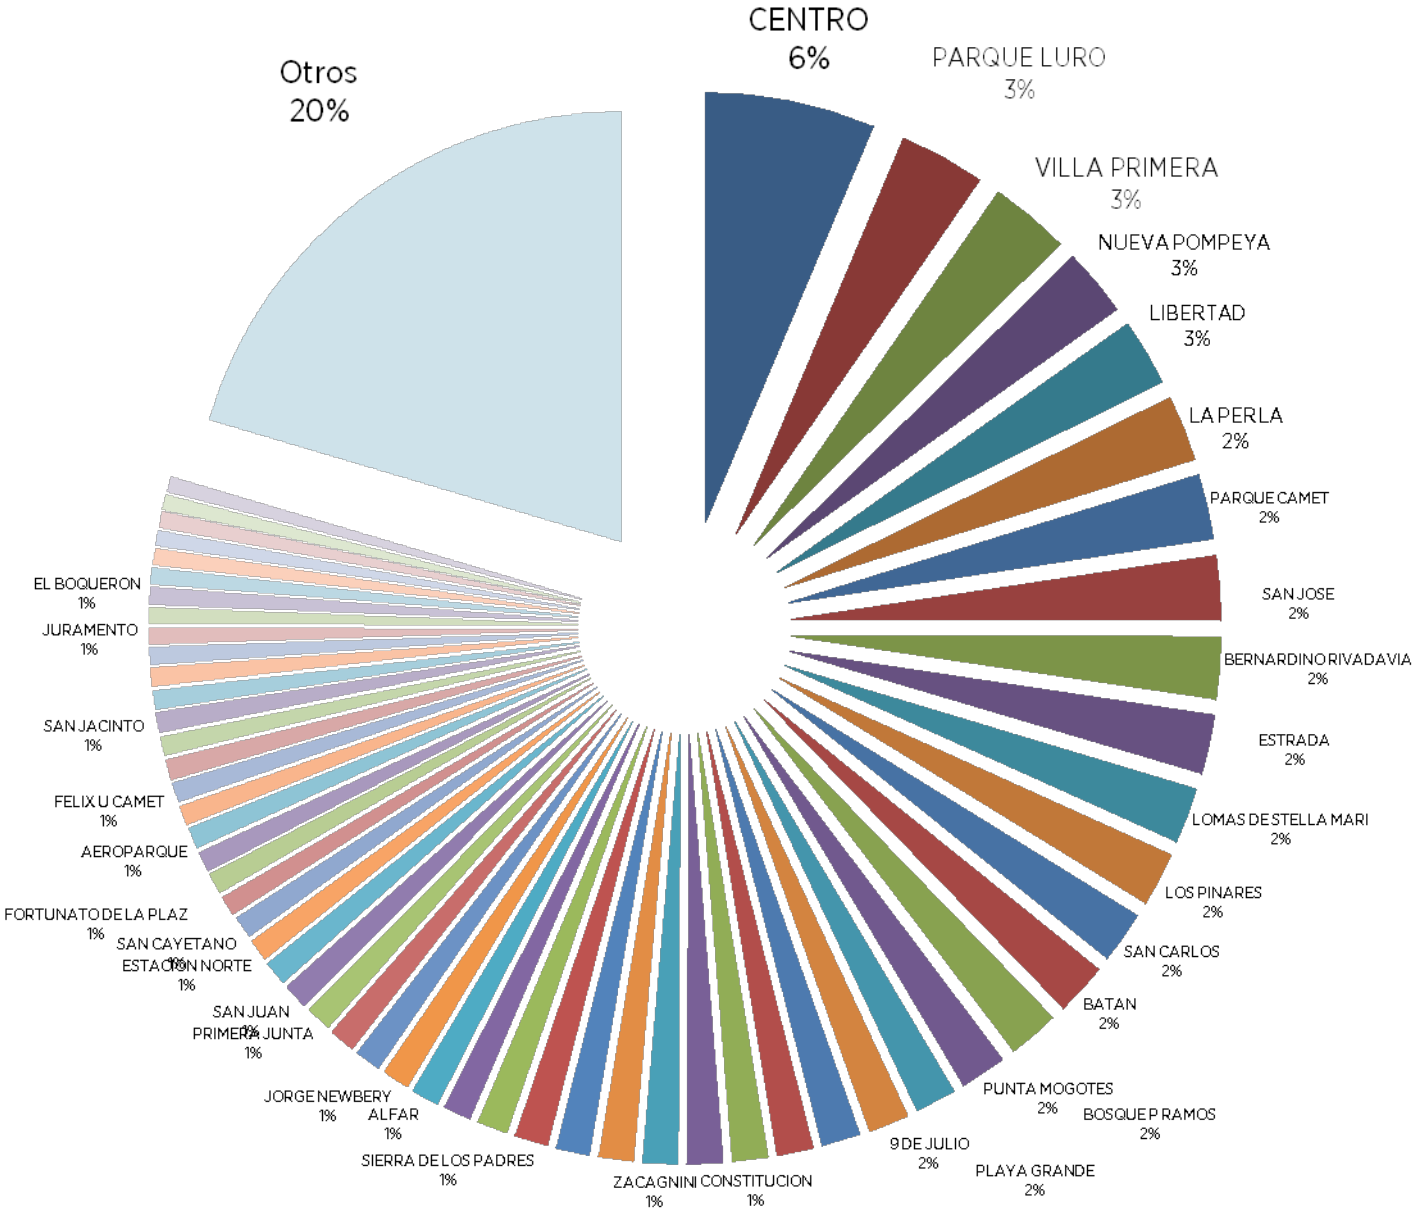

El gráfico demuestra que las intervenciones están distribuidas por todos los barrios con un porcentaje similar, destacándose zona centro debido a la cantidad de luminarias y concentración demográfica.

GUARDIA | MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE ARTEFACTOS

BARRIO	AGO	SEP	NOV	DIC	Total
LOS PINARES	94	199		30	**323**
SAN JOSE	85	15		4	**104**
BOSQUE ALEGRE	66				**66**
LAS AVENIDAS				66	**66**
NUEVA POMPEYA		60		4	**64**
BOSQUE GRANDE			64		**64**
BATAN			22		**22**
LOMAS STELLA MARIS		22			**22**
FUNES Y SAN LORENZO	12	2			**14**
PLAZA P RAMOS		11			**11**
DON BOSCO		3		2	**5**
GRAL ROCA		4			**4**
SAN PATRICIO				4	**4**
ESTACION TERMINAL		3			**3**
PLAYA GRANDE		2			**2**
SAN CARLOS		2			**2**
LA PERLA				2	**2**
BERNARDINO RIVADAVIA		1			**1**
DIVINO ROSTRO		1			**1**
VILLA PRIMERA	1				**1**
ESTACION NORTE				1	**1**
	258	**325**	**86**	**113**	782

Artefacto Ambar 2

Compacta

Fotometría de alto rendimiento

IP 66 Sealsafe®

Hermeticidad IP 66 en toda la luminaria

Vidrio y aluminio de gran calidad

Fijación lateral o vertical

Recambio: Reemplazar un artefacto en mal estado por uno nuevo.
Reacondicionamiento: Retirar artefacto, limpiar, arenar, pintar, controlar, reacondicionar y reinstalar.

Avenida Félix U. Camet:

Reacondicionamiento de 200 artefactos, entre Constitución y Parque Camet, trabajo en curso.

Ruta 88:

Reacondicionamiento de 346 luminarias entre Vértiz y Alamedas.

Microcentro:

Reacondicionamiento y re potenciación (150 a 250 W) de 134 luminarias, en el sector delimitado por Independencia, PP Ramos, Colón y Luro.

ARTEFACTO VIEJO

ARTEFACTO REACONDICIONADO

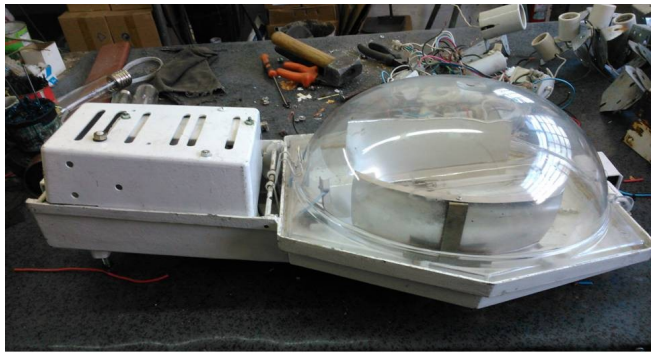

OBRAS ALUMBRADO

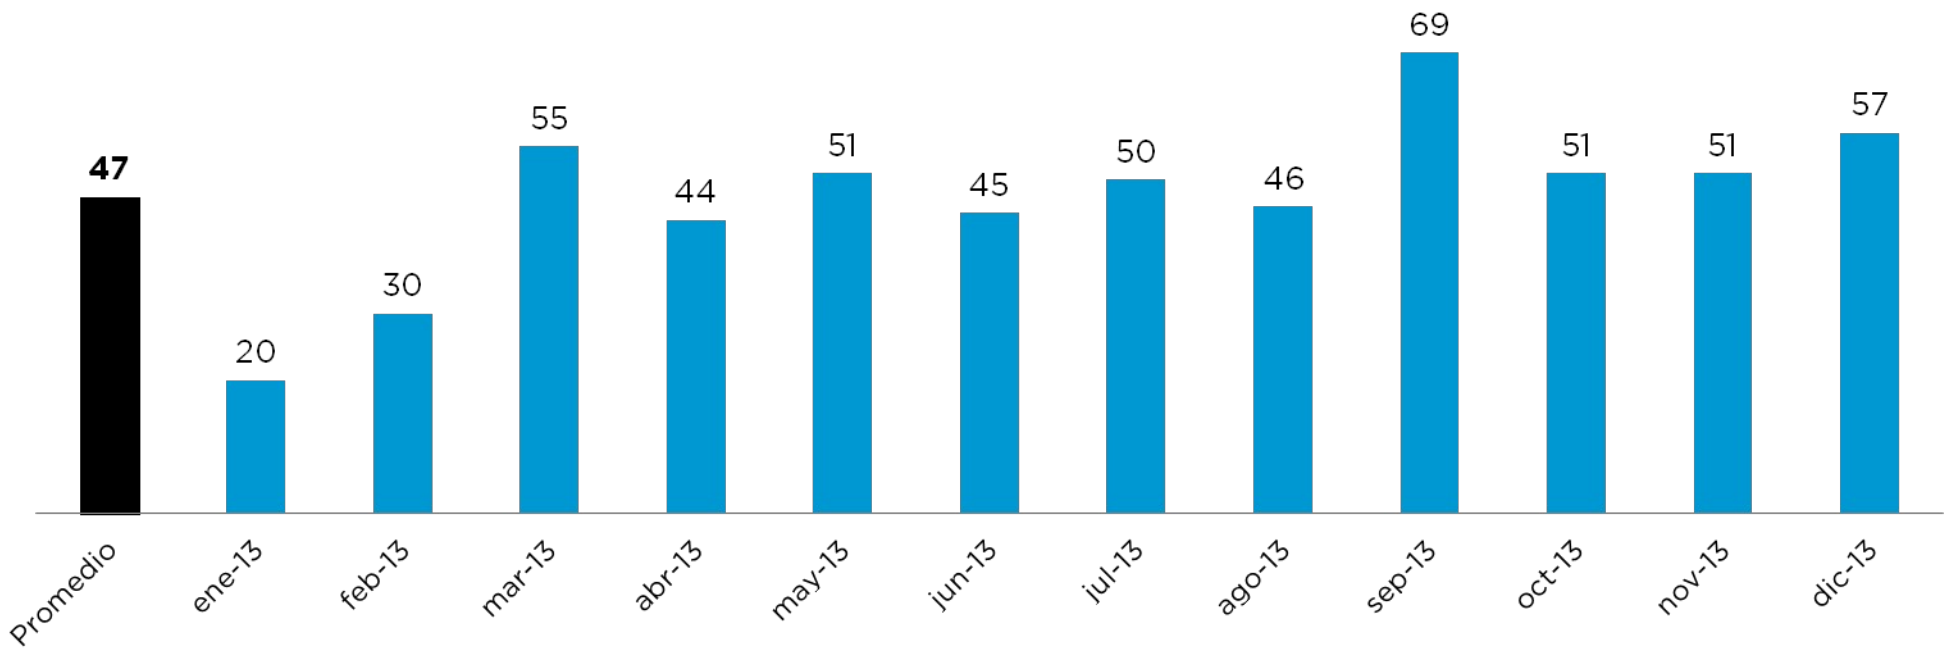

Se reemplazaron 461 columnas hasta octubre 2013.

Wi Fi Municipal:

Se alimentaron 20 puntos.

Noviembre 2013.

Puesta en valor paseo Aldao:

Se agregaron las farolas faltantes

(7 de 20) y se repararon conexiones subterráneas.

Noviembre 2013.

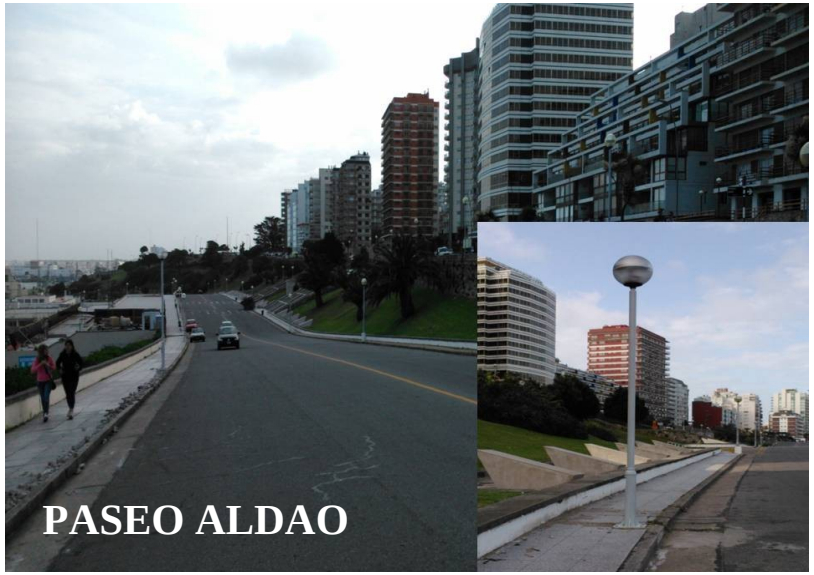

Playa Grande:

Se agregó una columnas x cuadra (APE), en el sector delimitado por Almafuerte – Rodríguez Peña – Pellegrini y Urquiza (60 columnas). Abril 2013.

Bº 9 DE JULIO:

Se repararon y recambiaron 56 columnas en mal estado. Junio 2013.

Bº DEL CENTRO:

Calle Corrientes entre Luro y Diagonal Alberdi se retiraron suspensiones y se colocaron 5 columnas (APE). Mayo 2013.

Bº DELLA PAOLERA:

Se colocó APE en calle Della Paolera entre Constitución y Mariani.

Pasos a nivel:

Se iluminaron los pasos a nivel de Brown, Falucho, Gascón, Alberti y Rawson.

Escollera Punta Iglesias:

trabajos de iluminación en curso.

DELLA PAOLERA

CRUCE DE VÍAS: CALLE BROWN

Iluminación Plaza y acceso a San Eduardo del Mar. Octubre 2013.

Iluminación Plaza Batán (frente Sociedad de fomento). Abril 2013.

Iluminación Colectora Batán, en curso.
Arreglos Navideños, en curso.

Colocación columnas cruce vías Polonia y Fortunato de la Plaza.

Mejora en la Iluminación Plaza Echeverría. Octubre 2013

147
Centro de Atención al Vecino

147 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO | RECLAMOS POR MES

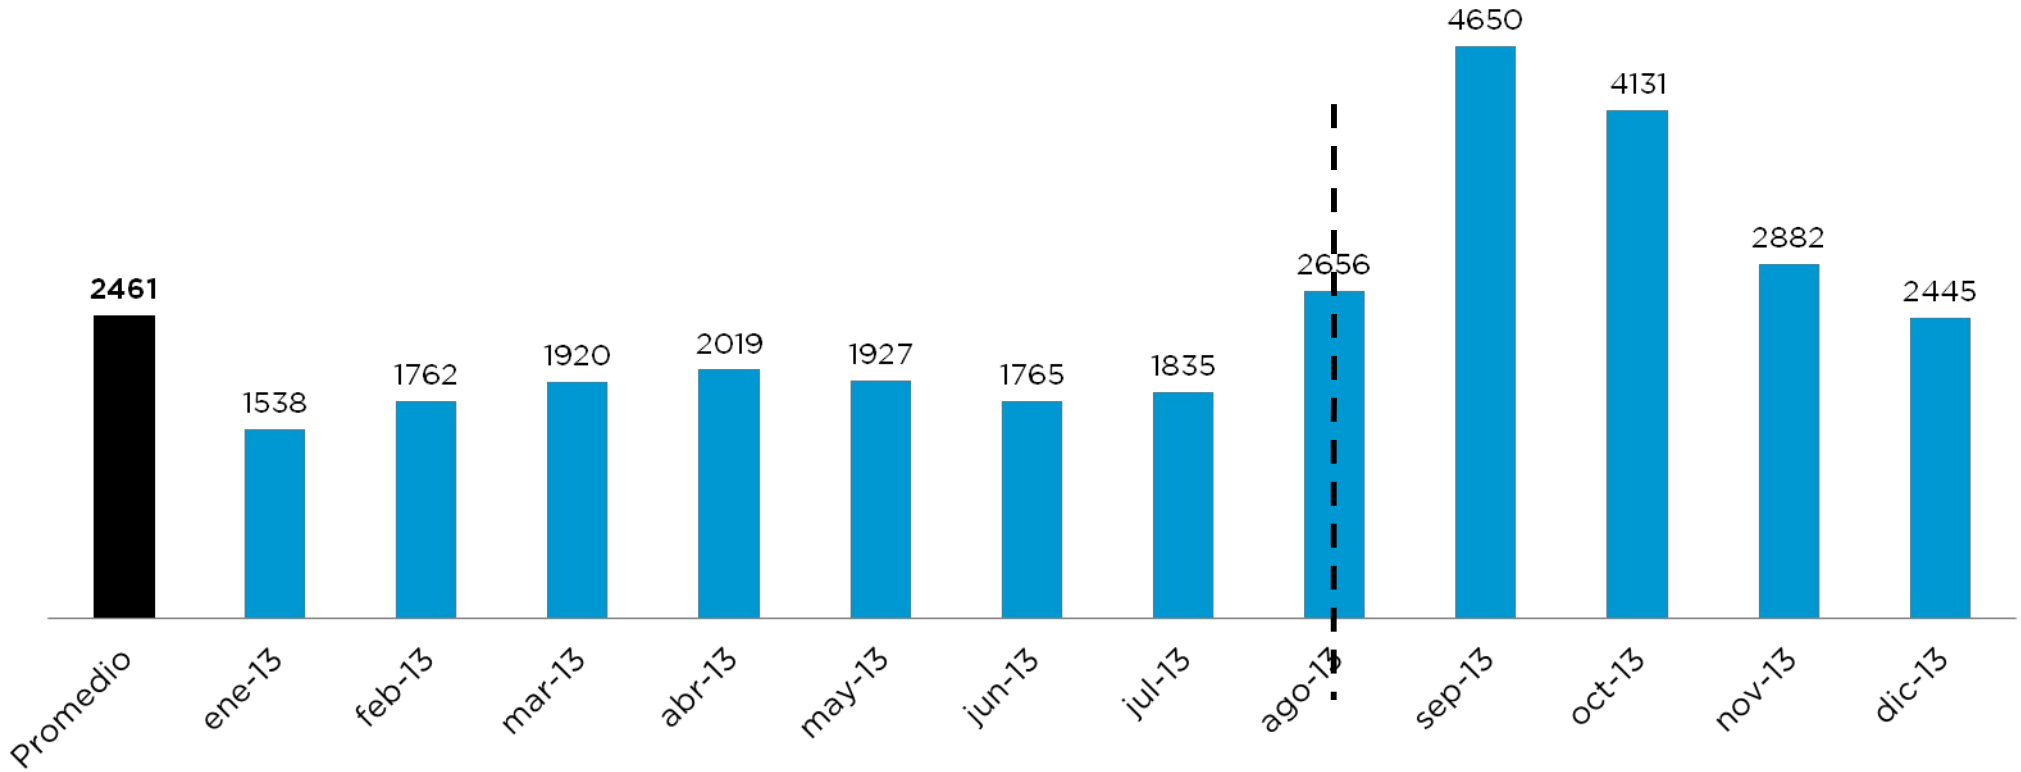

Con el lanzamiento del 147 el 26/08/2013 se duplicaron la cantidad de reclamos mensuales.

147 ATENCIÓN AL VECINO | ESTADO DE RECLAMOS

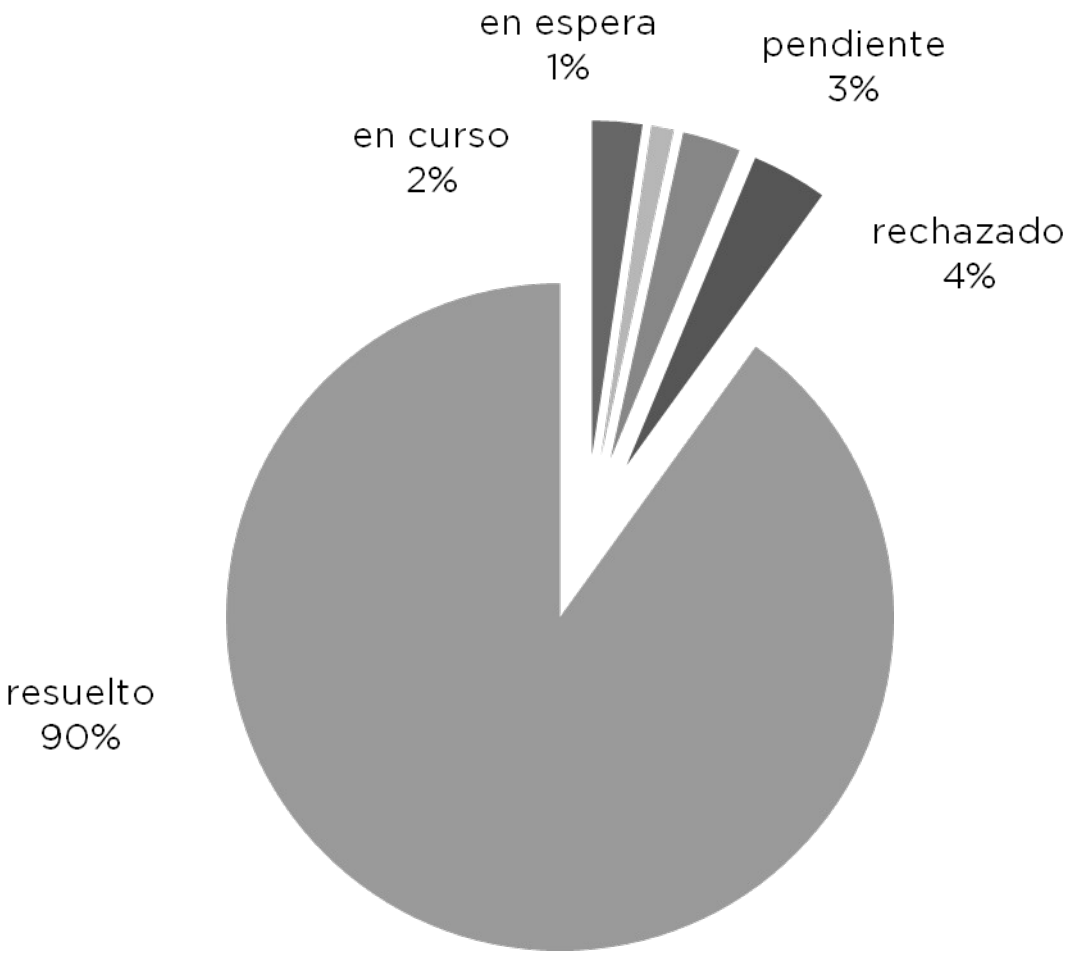

El 95% de los reclamos está resuelto (rechazado) o en curso.

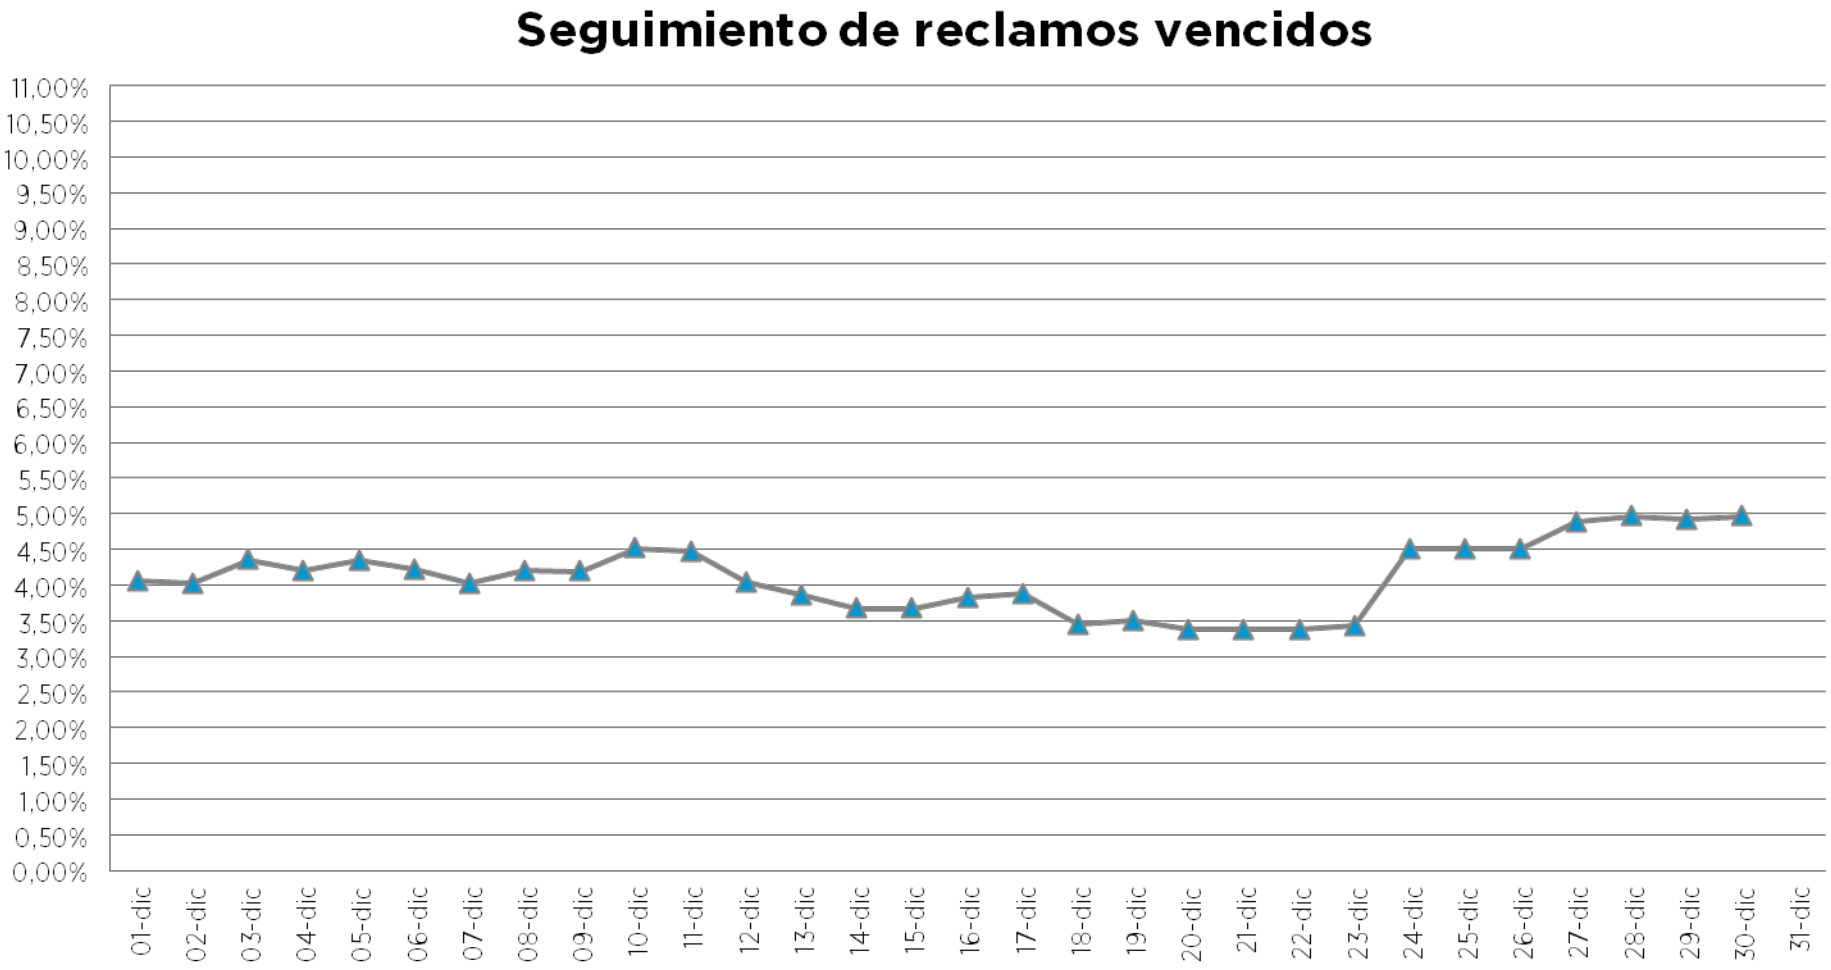

Inicio Oficial 147 el 28/08/2013, ese día el nivel de vencidos era del **6,8%**, hoy estamos en **4,77%**. Octubre cerró como el mejor mes desde que se lanzó el servicio.

VIALIDAD Y
ALUMBRADO
MGP
MAR DEL PLATA
BATÁN
